EXPEDIENTE
26/10/2021

Governo do Município de Conselheiro Lafaiete

Gabinete do Prefeito

Secretaria de Governo

OFÍCIO Nº 251/2021/SEGOV/GABPREF

Conselheiro Lafaiete, 20 de outubro de 2021.

Ao Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal
JOÃO PAULO FERNANDES RESENDE
Conselheiro Lafaiete - MG

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 413/2021

Senhor Presidente,

A Secretária Municipal de Governo, Simone do Carmo, no uso de suas atribuições legais, vem à presença de Vossa Excelência, encaminhar informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras, em resposta ao Requerimento nº 413/2021, de autoria do nobre Vereador Washington Fernando Bandeira, no qual solicita informações a respeito das obras na Avenida Geraldo Plaza, no Bairro Paulo VI.

Seguimos juntos no propósito da resolução de demandas.

Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Cordiais cumprimentos,

Simone do Carmo
Secretária de Governo

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
-20-Out-2021-16:51-036779-1/2

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE	**COMUNICAÇÃO INTERNA**	**Nº: 491/2021**	**CI**
		DATA: 18/10/2021	**FL.:1/1**

DE: Secretaria de Obras e Meio Ambiente	**PARA: Gabinete**

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento nº 413/2021

Prezados senhores,

Em referência ao Requerimento nº 413/2021, complemento ao Requerimento nº 194/2021, seguem as referidas respostas:

a) Planilha e cronograma físico/financeiro atualizada (anexos).
b) A rede pluvial foi executada conforme projeto e adaptadas conforme necessidades do local. A rede de esgoto é de responsabilidade da COPASA.
c) Não se trata de valas, são BL's que estão sem tampas e estão sendo sinalizadas pela empresa (relatório fotográfico em anexo). Estão sendo executados os serviços de finalizações das caixas.

Atenciosamente,

Daniel Moreira Coelho
Secretário Municipal de Obras e Meio Ambiente

CONTRATADA: 3T LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Contrato: 113/2020; Concorrência Pública: 006/2019; Processo Licitatório: 105/2019

Recapeamento Asfáltico e Drenagem Pluvial na Av. Geraldo Plaza, Paulo VI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Data: 14/10/2021


ITEM	SERVIÇOS DESCRIÇÃO	%	VALOR DO ITEM	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%	7º MÊS	%	8º MÊS	%	9º MÊS	%	10º MÊS	%	11º MÊS	%	12º MÊS	%	13º MÊS	%	14º MÊS	%	15º MÊS	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1%	R$ 30.742,50	R$ 23.362,05	76 %		0 %		0%	R$ 1.246,40	4%		0 %	R$ 1.869,60	6 %		0%	R$ 2.460,00	8%		0%		0%	R$ 1.804,00	6%		0%		0%		0%	R$ -	0%
2	MOVIMENTO DE TERRA	5%	R$ 157.383,50		0%	R$ 9.785,19	6 %	R$ 19.570,38	12 %	R$ 19.570,38	12 %	R$ 14.677,79	9 %	R$ 14.677,79	9 %	R$ 19.570,38	12 %	R$ 51.424,38	33 %		0%		0%		0%		0%		0%		0%	R$ 8.037,22	5%
3	PAVIMENTAÇÃO	77%	R$ 2.360.290,13		0%		0 %		0%		0%		0 %		0 %	R$ 175.854,89	7%	R$ 129.732,83	5%	R$ 162.166,04	7%	R$ 265.151,04	11 %	R$ 141.617,41	6%	R$ 117.195,22	5%	R$ 117.195,22	5%	R$ 703.171,32	30 %	R$ 541.705,22	23%
4	DRENAGEM	13%	R$ 384.084,82		0%	R$ 16.393,69	4 %	R$ 32.787,39	9%	R$ 32.787,39	9%	R$ 24.590,54	6 %	R$ 24.590,54	6 %	R$ 32.787,39	9%	R$ 37.876,03	10 %	R$ 70.341,19	18 %	R$ 52.107,13	14 %		0%		0%		0%		0%	R$ 64.594,68	17%
5	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0%	R$ 9.194,58		0%		0 %		0%		0%		0 %		0 %		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	R$ 9.194,58	100 %
6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0%	R$ 5.883,39	R$ 2.941,70	50 %		0 %		0%		0%		0 %		0 %		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	R$ 2.941,70	50%
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4%	R$ 121.935,00	R$ 2.748,31	2%	R$ 2.748,31	2 %	R$ 2.748,31	2%	R$ 2.748,31	2%	R$ 2.748,31	2 %	R$ 2.748,31	2 %	R$ 2.748,31	2%	R$ 13.107,81	11 %	R$ 7.058,05	6%	R$ 19.238,14	16 %	R$ 9.734,32	8%	R$ 9.734,32	8%	R$ 9.734,32	8%	R$ 9.734,32	8%	R$ 25.732,63	21%
	TOTAL	100 %	R$ 3.069.513,92	R$ 29.052,06	1%	R$ 28.927,20	1 %	R$ 55.106,08	2%	R$ 56.352,48	2%	R$ 42.016,64	1 %	R$ 43.886,24	1 %	R$ 230.960,97	8%	R$ 234.601,04	8%	R$ 239.565,28	8%	R$ 336.496,31	11 %	R$ 153.155,73	5%	R$ 126.929,54	4%	R$ 126.929,54	4%	R$ 712.905,64	23 %	R$ 652.206,03	21%
	% ACUMULADA			R$ 29.052,06	1%	R$ 57.979,26	2 %	R$ 113.085,34	4%	R$ 169.437,82	6%	R$ 211.454,45	7 %	R$ 255.340,69	8 %	R$ 486.301,66	16 %	R$ 720.902,70	23 %	R$ 960.467,98	31 %	R$ 1.296.964,29	42 %	R$ 1.450.120,02	47 %	R$ 1.577.049,56	51 %	R$ 1.703.979,10	56 %	R$ 2.416.884,74	79 %	R$ 3.069.513,92	100 %

LUCIANO XAVIER DE CASTRO:76022366615

Assinado de forma digital por LUCIANO XAVIER DE CASTRO:76022366615
Dados: 2021.10.14 16:10:28 -03'00'

CONTRATADA: 3T LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Contrato: 113/2020; Concorrência Pública: 006/2019; Processo Licitatório: 105/2019
Recapeamento Asfáltico e Drenagem Pluvial na Av. Geraldo Plaza, Paulo VI
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SINALIZAÇÃO
Data: 14/10/2021



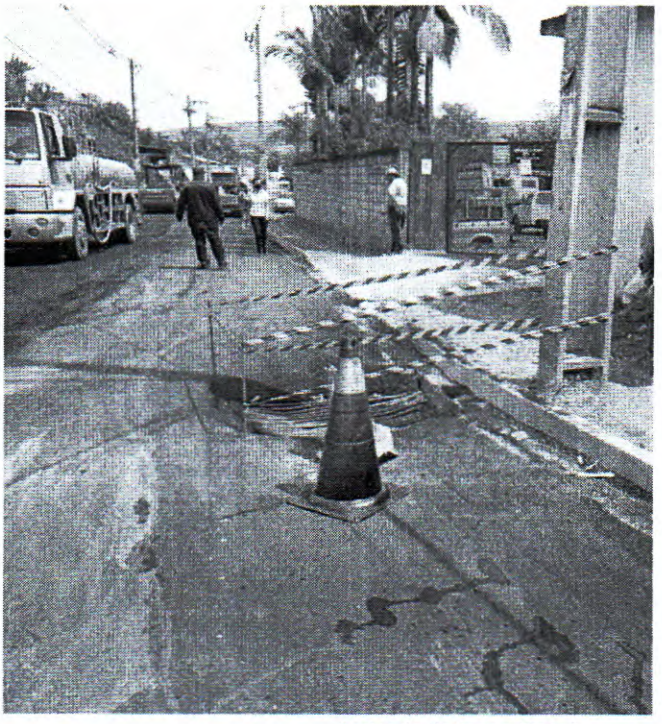

LUCIANO XAVIER DE CASTRO:76022366615

Assinado de forma digital por LUCIANO XAVIER DE CASTRO:76022366615
Dados: 2021.10.14 13:52:53 -03'00'

CONTRATADA: 3T LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Contrato: 113/2020; Concorrência Pública: 006/2019; Processo Licitatório: 105/2019
Recapeamento Asfáltico e Drenagem Pluvial na Av. Geraldo Plaza, Paulo VI
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SINALIZAÇÃO
Data: 14/10/2021







LUCIANO XAVIER DE CASTRO:76022366615

Assinado de forma digital por LUCIANO XAVIER DE CASTRO:76022366615
Dados: 2021.10.14 13:52:53 -03'00'

	CONTRATADA: 3T LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA
	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
	Contrato: 113/2020; Concorrência Pública: 006/2019; Processo Licitatório: 105/2019
	Recapeamento Asfáltico e Drenagem Pluvial na Av. Geraldo Plaza, Paulo VI
	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SINALIZAÇÃO
	Data: 14/10/2021

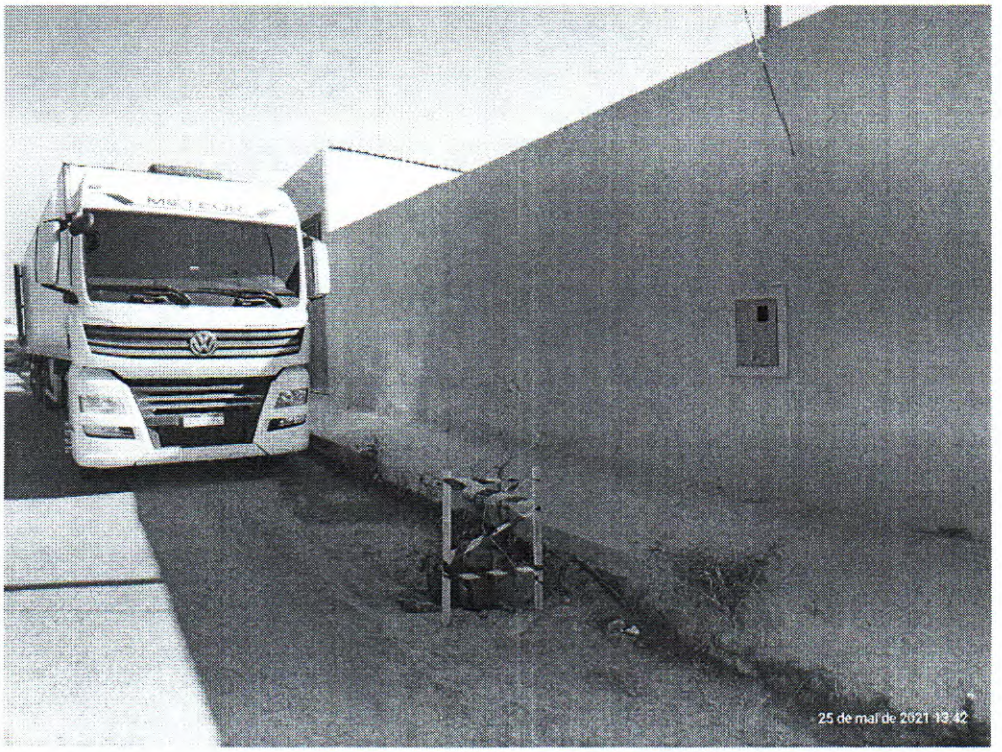

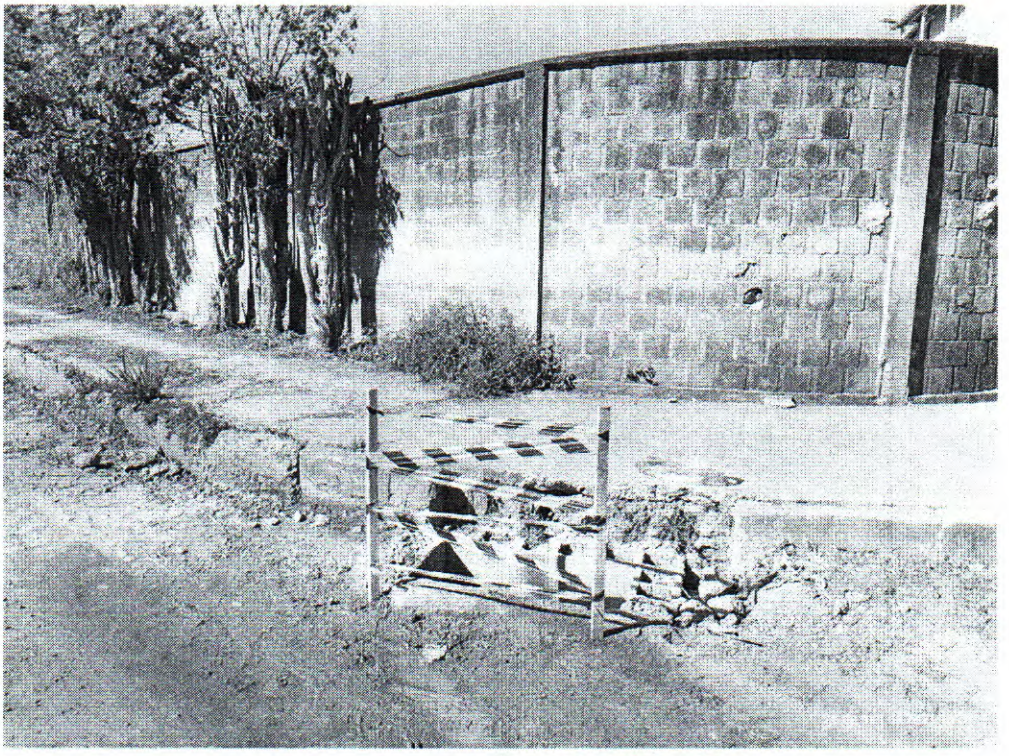

LUCIANO XAVIER DE CASTRO:76022366615

Assinado de forma digital por LUCIANO XAVIER DE CASTRO:76022366615
Dados: 2021.10.14 13:52:53 -03'00'

CONTRATADA: 3T LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Contrato: 113/2020; Concorrência Pública: 006/2019; Processo Licitatório: 105/2019
Recapeamento Asfáltico e Drenagem Pluvial na Av. Geraldo Plaza, Paulo VI
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SINALIZAÇÃO
Data: 14/10/2021







LUCIANO XAVIER DE CASTRO:76022366615

Assinado de forma digital por LUCIANO XAVIER DE CASTRO:76022366615
Dados: 2021.10.14 13:52:53 -03'00'

CONTRATADA: 3T LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Contrato: 113/2020; Concorrência Pública: 006/2019; Processo Licitatório: 105/2019
Recapeamento Asfáltico e Drenagem Pluvial na Av. Geraldo Plaza, Paulo VI
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SINALIZAÇÃO
Data: 14/10/2021

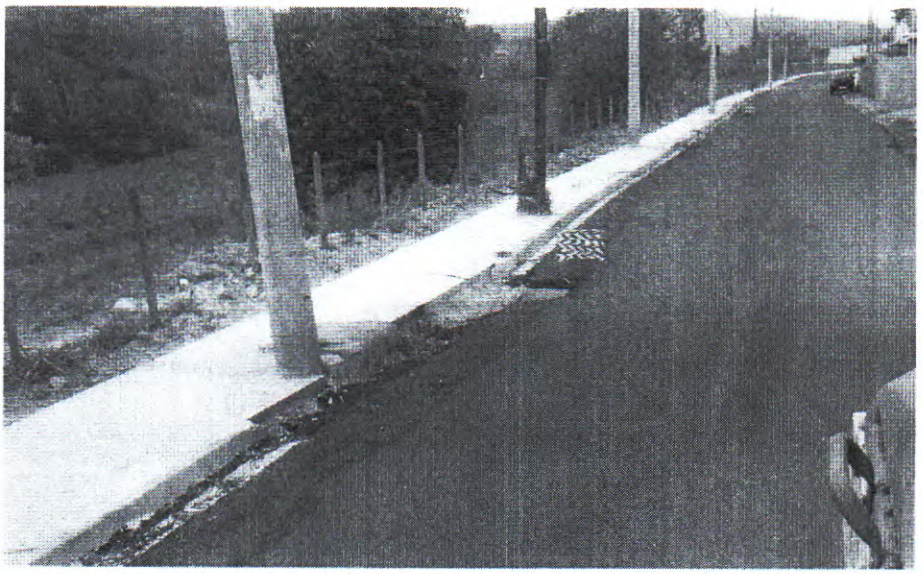

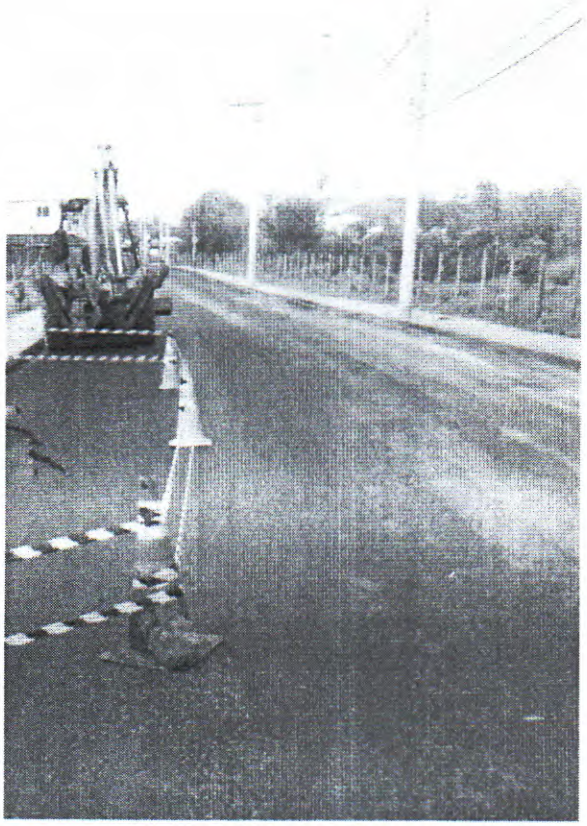

LUCIANO XAVIER DE CASTRO:76022366615

Assinado de forma digital por LUCIANO XAVIER DE CASTRO:76022366615
Dados: 2021.10.14 13:52:53 -03'00'
