PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 22 de abril de 2026.

Ofício nº 4470/26 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 181/2026**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 181/2026, de autoria da Nobre Vereadora Valentina, encaminhado pelo Ofício nº 378/2026-GP, de 12 de março de 2026, dessa Casa de Leis, sobre o cronograma, execução, conclusão e previsão de funcionamento da nova estrutura da Escola Municipal Cândido Portinari, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal de Obras, por meio do Memorando nº 18904, de 19 de março de 2026 e da Secretaria Municipal da Educação, por meio do Memorando nº 20412, de 24 de março de 2026.

Atenciosamente,

e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMOB/DIOB - DIRETORIA DE OBRAS	**Data:** 19/03/2026
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS; SMED - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	**Número:** 18904/2026
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 181/2026	

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Prezados,

Segue resposta da fiscalização a respeito da solicitação de informações encaminhada pela Vereadora Valentina.

Solicita-se à Secretaria de Educação complementação das questões 14,15,16,17 e 18.

1- Segue anexo cronograma físico financeiro.
2- O processo licitatório foi homologado 08/11/2023, e teve como empresa contratada para execução da obra a Ancema Construções Ltda.
3- 06/05/2025
4- Final de Abril/2026
5- Processo administrativo em andamento, embate com a empresa sobre a qualidade dos serviços executados e incoerências entre projetos, memorial técnico e planilha orçamentária.
6- Atualmente faltam 2 itens cruciais para o funcionamento da escola:

   - Finalização do cabeamento e do Rack de lógica;
   - Adequação do sistema de combate e prevenção de incêndio da edificação conforme projeto aprovado no Corpo de Bombeiros, para posterior certificado de aprovação da vistoria.

7- R$ 4.788.363,85
8- Houve. Foi necessário aditivo de vigência contratual (não englobando aditivo de prazo de execução), para tramitação do processo administrativo e do processo de aditivo de serviços. Atualmente ainda está tramitando o processo de aditivo de serviços, após diversas contestações da contratada sobre os não aprovados pela fiscalização, está em fase final de análise desses quantitativos.
   Não foi aprovado o aditivo de prazo de execução devido ao atraso da obra se tratar de culpa exclusiva da contratada.

9- Os recursos utilizados para esta obra provêm exclusivamente de verba municipal.
10- Segue anexo relatórios técnicos de fiscalização.
11- Não.
12- A não finalização dos serviços citados no item 6.
13- Não foi realizada tais vistorias, após finalização dos serviços de sistema de prevenção e combate a incêndio, será realizado o pedido de vistoria no Corpo de Bombeiros e solicitação da vistoria de CVCO e Habite-se, para liberação do funcionamento da unidade.

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU – PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB

Foz do Iguaçu, 19 de março de 2026.

_____

LEONARDO TOFFOLI FALK

Engenheiro Civil Jr.

Matrícula 24.247-01

CREA-PR 217.204/D

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Prefeitura de Foz do Iguaçu 5
Prefeitura de Foz do Iguaçu 4

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

PRÓPRIO: ESCOLA CÂNDIDO PORTINARI

MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU

LOCAL: RUA GÁSPAR, 499 - JARDIM PETRÓPOLIS - FOZ DO IGUAÇU

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	210	% NO PERIODO	240	% NO PERIODO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	11,03%	294.480,89	50,00%	176.688,53	30,00%	117.792,36	20,00%		0,00%								
2.0	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA ESCOLA CÂNDIDO PORTINARI	25,22%	67.348,61	5,00%	134.697,23	10,00%	202.045,84	15,00%	202.045,84	15,00%	202.045,84	15,00%	202.045,84	15,00%	202.045,84	15,00%	134.697,23	10,00%
3.0	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA QUADRA POLIESPORTIVA	4,52%		0,00%					36.233,46	15,00%	48.311,29	20,00%	72.466,93	30,00%	48.311,29	20,00%	36.233,46	15,00%
4.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO VERTICAL	3,45%		0,00%											36.839,96	20,00%	36.839,96	20,00%
5.0	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETO	20,32%		0,00%														
6.0	ESQUADRIAS	10,66%		0,00%													113.852,70	20,00%
7.0	BANCADAS, PRATELEIRAS E ASSESSÓRIOS EM GERAL	4,11%		0,00%														
8.0	PROJETO ELÉTRICO	4,65%		0,00%														
9.0	PROJETO LÓGICA	0,91%		0,00%													9.751,26	20,00%
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,05%		0,00%														
11.0	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	1,24%		0,00%														
12.0	DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	0,07%		0,00%														
13.0	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1,64%		0,00%														
14.0	ABRIGO DE RESÍDUOS	0,31%		0,00%														
15.0	CENTRAL GLP	0,25%		0,00%														
16.0	ESCADA E RAMPA DE ACESSO	1,20%		0,00%														
17.0	FECHAMENTO - (GRADIL E MURO PALITO)	4,52%		0,00%														
18.0	ARBORIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL	0,85%		0,00%														
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	100%	361.829,50	6,77%	311.385,76	5,83%	319.838,20	5,99%	238.279,30	4,46%	250.357,13	4,69%	274.512,77	5,14%	287.197,08	5,38%	331.374,61	6,20%
	VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO		**361.829,50**	6,77%	**311.385,76**	5,83%	**319.838,20**	5,99%	**238.279,30**	4,46%	**250.357,13**	4,69%	**274.512,77**	5,14%	**287.197,08**	5,38%	**331.374,61**	6,20%
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		361.829,50	6,77%	673.215,26	12,60%	993.053,46	18,59%	1.231.332,76	23,05%	1.481.689,89	27,74%	1.756.202,66	32,88%	2.043.399,74	38,26%	2.374.774,35	44,46%

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código d8b22d05-610d-41ae-9703-386b8bb558af.

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Prefeitura de Foz do Iguaçu 6

Prefeitura de Foz do Iguaçu 5

DATA: 06/06/2023
TIPO OBRA: EXECUÇÃO
PROTOCOLO:

270	% NO PERIODO	300	% NO PERIODO	330	% NO PERIODO	360	% NO PERIODO	390	% NO PERIODO	420	% NO PERIODO	450	% NO PERIODO	480	% NO PERIODO	510	% NO PERIODO	540	% NO PERIODO	BDI VALOR SERVIÇO C/ BDI	22,6500% VALOR PLANILHA S/ BDI
																				588.961,78	**480197,13**
																				1.346.972,26	**1098224,43**
																				241.556,43	**196947,76**
36.839,96	20,00%	36.839,96	20,00%	36.839,96	20,00%															184.199,79	**150183,28**
		162.769,74	15,00%	217.026,32	20,00%	217.026,32	20,00%	162.769,74	15,00%	162.769,74	15,00%	162.769,74	15,00%							1.085.131,61	**884738,37**
113.852,70	20,00%	113.852,70	20,00%	113.852,70	20,00%	113.852,70	20,00%													569.263,49	**464136,56**
												87.846,29	40,00%	87.846,29	40,00%	43.923,15	20,00%			219.615,73	**179058,89**
49.709,08	20,00%	49.709,08	20,00%	49.709,08	20,00%	49.709,08	20,00%	49.709,08	20,00%											248.545,42	**202646,08**
9.751,26	20,00%	9.751,26	20,00%	9.751,26	20,00%	9.751,26	20,00%													48.756,31	**39752,39**
		13.496,74	5,00%	53.986,95	20,00%	53.986,95	20,00%	94.477,16	35,00%	53.986,95	20,00%									269.934,73	**220085,39**
		13.293,55	20,00%	13.293,55	20,00%	3.323,39	5,00%	13.293,55	20,00%	23.263,71	35,00%									66.467,75	**54193,03**
						198,05	5,00%	792,18	20,00%	1.386,32	35,00%	792,18	20,00%	792,18	20,00%					3.960,92	**3229,45**
								8.739,02	10,00%	78.651,20	90,00%									87.390,22	**71251,71**
												4.991,66	30,00%	4.991,66	30,00%	4.991,66	30,00%	1.663,89	10,00%	16.638,88	**13566,15**
												4.061,40	30,00%	4.061,40	30,00%	4.061,40	30,00%	1.353,80	10,00%	13.538,00	**11037,91**
												15.972,52	25,00%	15.972,52	25,00%	15.972,52	25,00%	15.972,52	25,00%	63.890,07	**52091,37**
												60.359,43	25,00%	60.359,43	25,00%	60.359,43	25,00%	60.359,43	25,00%	241.437,73	**196850,98**
																22.581,91	50,00%	22.581,91	50,00%	45.163,83	**36823,34**
210.153,00	3,93%	399.713,03	7,48%	494.459,82	9,26%	447.847,74	8,38%	329.780,74	6,17%	320.057,92	5,99%	336.793,23	6,31%	174.023,49	3,26%	151.890,07	2,84%	101.931,55	1,91%	5.341.424,94	4.355.014,22
210.153,00	3,93%	**399.713,03**	7,48%	**494.459,82**	9,26%	**447.847,74**	8,38%	**329.780,74**	6,17%	**320.057,92**	5,99%	**336.793,23**	6,31%	**174.023,49**	3,26%	**151.890,07**	2,84%	**101.931,55**	1,91%	**5.341.424,94**	
2.584.927,35	48,39%	2.984.640,38	55,88%	3.479.100,20	65,13%	3.926.947,94	73,52%	4.256.728,68	79,69%	4.576.786,60	85,68%	4.913.579,83	91,99%	5.087.603,32	95,25%	5.239.493,39	98,09%	5.341.424,94	100,00%		

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código d8b22d05-610d-41ae-9703-386b8bb558af.

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **CRONOGRAMA**

Número: **41/2023**

Assunto: **CRONOGRAMA ESCOLA CANDIDO PORTINARI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=d8b22d05-610d-41ae-9703-386b8bb558af&cpf=05401760957
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
d8b22d05-610d-41ae-9703-386b8bb558af

Hash do Documento

A24F34126036FF5E06D015A952CD586376C6F211A239DF4CD621EFA41979F42D

Anexos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.pdf - **9eb6b2fa-887d-4e4a-a3ac-5cbd5766baf4**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/06/2023 é(são) :

LUIZ FERNANDO DE BRITO (Signatário) - CPF: ***76236901** em 06/06/2023 11:26:28 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

ANDREY BACHIXTA DIAS (Signatário) - CPF: ***01760957** em 06/06/2023 12:12:51 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Prefeitura de Foz do Iguaçu 8
Prefeitura de Foz do Iguaçu 7
Prefeitura de Foz do Iguaçu 1

NOTIFICAÇÃO DE OBRAS

DADOS DO CONTRATO			
OBRA: Construção da Escola Municipal Cândido Portinari		**CONTRATO**: 235/2023	
Ass. do CT: 09/11/2023	**O.S:** 14/11/2023	**Execução**: 06/05/2025	**Vigência**: 31/07/2025
CONTRATADA: ANCEMA CONSTRUÇÕES LTD – CNPJ: 06.974.313/0001-27			

Relatório de Inconformidades

Considerando Cláusula 8° do Contrato 235/2022

a. Assegurar a execução do objeto deste contrato conforme especificado no **ANEXO II**- Projeto Básico do Edital de Licitação supracitado, dentro dos melhores padrões de qualidade possível, além da proteção e a conservação dos serviços executados;

b. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários de sua responsabilidade independente das penalidades cabíveis;

Considerando Cláusula 8° do Contrato 235/2022 – Parágrafo Terceiro:

a. Responder de maneira absoluta e inescusável pela perfeição dos SERVIÇOS, pelos materiais empregados, que deverão ser de primeira qualidade e fornecidos pela mesma, conforme as especificações descritas nos projetos e de acordo com as normas da ABNT.

h. Se, por circunstâncias imputável à CONTRATADA, os SERVIÇOS realizados apresentarem omissões ou defeitos decorrentes de sua execução, a Contratante notificará, por escrito, à CONTRATADA, que deverá corrigir essas omissões ou defeitos sem quaisquer ônus para o Contratante e nos prazos por esta última estipulados.

Notifica-se a contratada a sanar as irregularidades conforme apontadas abaixo:

1. **Setor: Entrada Coberta:**

a. **Portão de Acesso (PORTÃO 1) 3,50x210 Duas folhas de veneziana de abrir**: Portão desprovido de guarnição.
b. **Acabamento – Revestimento Pastilha**: Constata-se a ausência de acabamento nos rufos de ambos os lados, presença de sujeira nas pastilhas internas e a falta da saia.
c. **Acabamento – Piso**: Ausência da soleira e a presença de sujeira no local.
d. **Acabamento – Pintura Teto:** Verifica-se a ausência de acabamento realizado com lixa.
e. **Acabamento –Pintura Parede**: Foi realizado apenas o emassamento, estando pendente a aplicação de pintura.

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Prefeitura de Foz do Iguaçu 9
Prefeitura de Foz do Iguaçu 8
Prefeitura de Foz do Iguaçu 2

















FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

2. Saguão de Entrada:

a. **Portão de Acesso (PORTÃO 1) 3,50x210 Duas folhas de veneziana de abrir:** Portão desprovido de guarnição.
b. **Acabamento – Revestimento Pastilha:** Observa-se acúmulo de sujeira no rejunte abaixo da bancada, bem como ausência de rejunte nas proximidades da mesma.
c. **Acabamento – Piso:** Em conformidade quanto à execução, porém apresenta sujidade.
d. **Acabamento – Pintura Teto:** O local encontra-se apenas emassado, sem acabamento final.
e. **Acabamento – Pintura Parede:** O local encontra-se apenas emassado, sem acabamento final.
f. **Acabamento – Luminária / Interruptores:** Luminárias em conformidade; entretanto, constatou-se a ausência de espelhos nos interruptores.
g. **Aspectos relevantes a serem observados:** Os apoios da bancada estão em desacordo com o especificado; os tubos de esgoto encontram-se aparentes e há ausência de acabamento nas portas do sanitário PCD.









PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e
















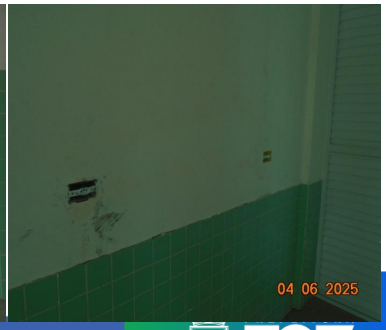

FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e





3. Sanitário PCD: Dois sanitários da Recepção

a. **Janela: 80x80:** Ausência da janela.
b. **Acabamento – Pintura Teto:** Constata-se a ausência de acabamento na cerâmica e no teto, bem como a necessidade de aplicação de uma segunda demão de tinta em ambas.
c. **Pia:** No banheiro à direita da entrada, a torneira instalada está em desacordo com o especificado; no segundo banheiro, a torneira está ausente. Observa-se ainda o sifão deslocado em ambos os ambientes.
d. **Sanitário:** Sanitários nos conformes, porém ausência de barras de apoio vertical.









PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e



FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Prefeitura de Foz do Iguaçu 14
Prefeitura de Foz do Iguaçu 13
Prefeitura de Foz do Iguaçu 7

4. **Secretaria:**


a. **Porta P1: 90x210:** A porta encontra-se posicionada em uma altura superior ao nível correto do piso.
b. **Janela: 200x120 (duas):** Constata-se a ausência de puxadores em ambas as janelas.
c. Guichê de atendimento: G1 150X110 P: 100 / G2 100X135 P:75: Falta instalção dos guichês
d. **Acabamento – Pintura Teto:** O local encontra-se apenas emassado, sem acabamento final.
e. **Acabamento – Pintura Parede:** O local encontra-se apenas emassado, sem acabamento final.
f. **Acabamento – Luminária / Interruptores**: As luminárias estão nos conformes; no entanto, os espelhos dos interruptores apresentam sujeira de massa, e o acabamento das janelas está incompleto.










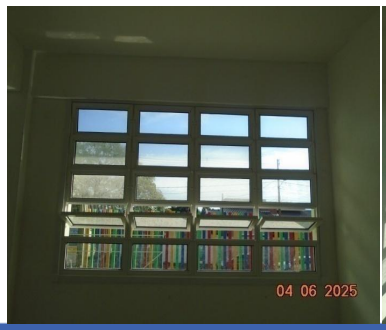

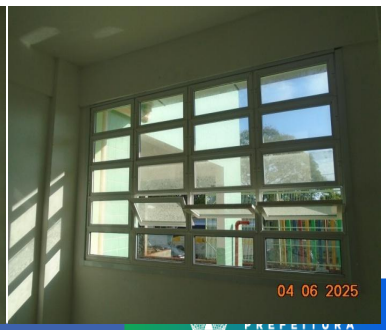

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e



5. Direção:

a. **Acabamento – Piso:** Em conformidade quanto à execução, porém apresenta sujidade.
b. **Acabamento – Pintura Teto:** O local encontra-se apenas emassado, sem acabamento final.
c. **Acabamento – Pintura Parede:** O local encontra-se apenas emassado, sem acabamento final.
d. **Acabamento – Luminária / Interruptores:** Luminárias em conformidade; entretanto, constatou-se a ausência de espelhos nos interruptores.
e. **Aspecto relevante a ser observado:** Rodapé cerâmico requer calafetagem.









PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e



6. **Coordenação:**

a. **Janela: 200x120 (fachada):** Constata-se a ausência de puxador e acabamento de vista.
b. **Acabamento – Piso:** Em conformidade quanto à execução, porém apresenta sujidade.
c. **Acabamento – Pintura Teto:** Necessário uma segunda demão de emassamento no local.
d. **Acabamento – Pintura Parede:** Necessário uma segunda demão de emassamento no local.
e. **Acabamento – Luminária / Interruptores:** Luminárias em conformidade; entretanto, constatou-se a ausência de espelhos nos interruptores.









PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e













PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e



7. Sala dos Professores:

a. **Janela: 300x120 (fachada)**: Constata-se a ausência de puxador.
b. **Acabamento – Piso:** Em conformidade quanto à execução, porém apresenta sujidade.
c. **Acabamento – Pintura Teto:** Necessária a realização da pintura no local.
d. **Acabamento – Pintura Parede**: Necessário uma segunda demão de emassamento no local.
e. **Acabamento – Luminária / Interruptores:** Luminárias em conformidade; entretanto, constatou-se a ausência de espelhos nos interruptores.









PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e








8. Sanitário Masculino:

a. **Janela: 130x80 / 180x80 (fachada):** Constata-se a ausência de puxador.
b. Acabamento Revestimento parede: Necessita de acabamento nas quinas cerâmicas
c. **Acabamento – Piso:** Em conformidade quanto à execução, porém apresenta sujidade.
d. **Acabamento – Pintura Teto:** Necessária a realização de uma segunda demão de pintura no local.
e. **Pia:** Torneiras em desacordo com o especificado.
e. **Divisórias:** A divisória dos banheiros apresenta espessura inferior à especificada.
f. **Portas / fechaduras:** Ausência do acabamento das fechaduras.



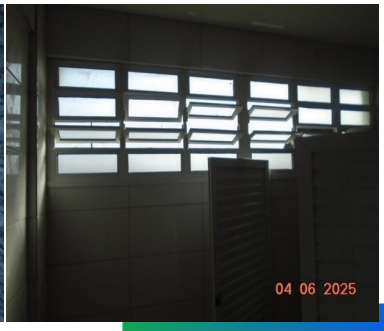

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e









9. Sanitário Feminino:

a. **Janela: 200x80 / 130x80 (fachada):** Executada uma janela inteiriça, constata-se a ausência de puxador.
b. **Acabamento – Piso:** Em conformidade quanto à execução, porém apresenta sujidade.
c. **Acabamento – Pintura Teto:** Necessária a realização de uma segunda demão de pintura no local.
d. **Acabamento – Pintura Parede:** Necessário acabamento na quina das paredes.
f. **Pia:** Torneiras em desacordo com o especificado.
e. **Divisórias:** A divisória dos banheiros apresenta espessura inferior à especificada.





PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e





10. Sanitário PCD:

a. **Janela: 235x30:** Ausência da janela.
b. **Acabamento – Piso:** Em conformidade quanto à execução, porém apresenta sujidade.
c. **Acabamento – Pintura Teto:** Necessária a realização de uma segunda demão de pintura no local.
d. **Acabamento – Pintura Parede:** Necessário acabamento na quina das paredes, e uma peça cerâmica está com ausência do rejunte.
g. **Pia:** Sifão deslocado e verificou-se a ausência da torneira.
h. **Barras de apoio**: Ausência de barra horizontal na lateral do sanitário.









PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e







11. Sala de Aula 06:

a. Porta P1: 90x210: Em desacordo com o especificado.
b. **Janela: 300x120 (fachada) 02 janelas:** Constata-se a ausência de puxador.
c. **Janela: 200x90 (pátio interno) 02 janelas:** Constata-se a ausência de puxador.
d. **Acabamento – Roda meio:** Encontra-se divergente da especificada.
e. **Acabamento – Piso:** O piso se encontra embarrigado na área cental, próximo às janelas da fachada.
f. **Acabamento – Pintura Teto:** Necessária a realização de uma segunda demão de pintura no local.
g. **Acabamento – Pintura Parede:** Necessária a realização de uma segunda demão de pintura no local.





PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e







12. Sala de Aula 05:

a. Porta P1: 90x210: Em desacordo com o especificado.
f. **Janela: 300x120 (fachada) 02 janelas:** Constata-se a ausência de puxador.
b. **Janela: 300x120 (divisa leste) 02 janelas:** Constata-se a ausência de puxador.
c. **Acabamento – Roda meio:** Encontra-se divergente da especificada.
d. **Acabamento – Piso:** Em conformidade quanto à execução, porém apresenta sujidade.
e. **Acabamento – Pintura Teto:** Necessária a realização de uma segunda demão de pintura no local.
f. **Acabamento – Pintura Parede:** Necessária a realização de uma segunda demão de pintura no local.
g. **Acabamento – Luminária / Interruptores:** As luminárias estão nos conformes; no entanto, os espelhos dos interruptores apresentam sujeira de tinta.

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e



PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e









13. Sala de Aula 04:

a. Porta P1: 90x210: Em desacordo com o especificado.
b. **Janela: 300x120 (divisa leste) 02 janelas:** Constata-se a ausência de puxador.
c. **Janela: 200x90 (pátio interno) 02 janelas:** Constata-se a ausência de puxador.
d. **Acabamento – Roda meio:** Encontra-se divergente da especificada.
e. **Acabamento – Piso:** Em conformidade quanto à execução, porém apresenta sujidade.
f. **Acabamento – Pintura Teto:** Necessária a realização de uma segunda demão de pintura no local.
g. **Acabamento – Pintura Parede:** Necessária a realização de uma segunda demão de pintura no local.
h. **Acabamento – Luminária / Interruptores:** As luminárias estão nos conformes; no entanto, os espelhos dos interruptores apresentam sujeira de tinta.





FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e















PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

14. Sala de Aula 03:

a. Porta P1: 90x210: Em desacordo com o especificado.
b. **Janela: 300x120 (divisa leste) 02 janelas:** Constata-se a ausência de puxador.
c. **Janela: 200x90 (pátio interno) 02 janelas:** Constata-se a ausência de puxador.
d. **Acabamento – Roda meio:** Encontra-se divergente da especificada.
e. **Acabamento – Piso:** Em conformidade quanto à execução, porém apresenta sujidade.
f. **Acabamento – Pintura Teto:** Necessária a realização de uma segunda demão de pintura no local.
g. **Acabamento – Pintura Parede:** Necessária a realização de uma segunda demão de pintura no local.
h. **Acabamento – Luminária / Interruptores:** As luminárias estão nos conformes; no entanto, os espelhos dos interruptores apresentam sujeira de tinta.













FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e







15. Sala de Aula 02:

a. Porta P1: 90x210: Em desacordo com o especificado.
b. **Janela: 300x120 (divisa leste) 02 janelas**: Constata-se a ausência de puxador.
c. **Janela: 200x90 (pátio interno) 02 janelas**: Constata-se a ausência de puxador.
d. **Acabamento – Roda meio:** Encontra-se divergente da especificada.
e. **Acabamento – Piso:** Em conformidade quanto à execução, porém apresenta sujidade.
f. **Acabamento – Pintura Teto:** Necessária a realização de uma segunda demão de pintura no local.
g. **Acabamento – Pintura Parede:** Necessária a realização de uma segunda demão de pintura no local, além de ser necessário uma limpeza do rodapé.





PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e







16. Sala de Aula 01:

a. Porta P1: 90x210: Em desacordo com o especificado.
b. Janela: 300x120 (divisa leste) 02 janelas: Constata-se a ausência de puxador.
c. Janela: 300x120 (fachada sul) 02 janelas: Constata-se a ausência de puxador.
d. **Acabamento – Roda meio:** Encontra-se divergente da especificada.
e. **Acabamento – Piso:** Em conformidade quanto à execução, porém apresenta sujidade.
f. **Acabamento – Pintura Teto:** Necessária a realização de uma segunda demão de pintura no local.
g. **Acabamento – Pintura Parede:** Necessária a realização de uma segunda demão de pintura no local.
h. **Acabamento – Luminária / Interruptores:** As luminárias estão nos conformes; no entanto, os espelhos dos interruptores apresentam sujeira de tinta.





FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e









17. MultiMídia:

a. Porta P1: 90x210: Em desacordo com o especificado.
b. **Janela: 300x120 (fachada sul) 02 janelas**: Constata-se a ausência de puxador.
c. **Janela: 200x90 (pátio interno) 02 janelas**: Constata-se a ausência de puxador.
d. **Acabamento – Roda meio:** Encontra-se divergente da especificada.
e. **Acabamento – Piso:** Em conformidade quanto à execução, porém apresenta sujidade.
f. **Acabamento – Pintura Teto:** Necessária a realização de uma segunda demão de pintura no local.
g. **Acabamento – Pintura Parede:** Necessária a realização de uma segunda demão de pintura no local.
h. **Acabamento – Luminária / Interruptores:** As luminárias estão nos conformes; no entanto, os espelhos dos interruptores apresentam sujeira de tinta.

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e











18. Biblioteca:

a. **Porta P1: 90x210:** Em desacordo com o especificado.
b. **Janela: 300x120 (fachada sul) 02 janelas:** Puxador necessita de força para abrir.
c. **Janela: 200x90 (pátio interno) 02 janelas:** Puxador necessita de força para abrir.
d. **Acabamento – Roda meio:** Encontra-se divergente da especificada.
e. **Acabamento – Piso:** Sujo
f. **Acabamento – Pintura Teto:** Necessária a realização de uma segunda demão de pintura no local.
g. **Acabamento – Pintura Parede:** Necessária a realização de uma segunda demão de pintura no local.
h. **Acabamento – Luminária / Interruptores:** Ok, porém há a ausência de um espelho em uma tomada.

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Prefeitura de Foz do Iguaçu 32
Prefeitura de Foz do Iguaçu 31
Prefeitura de Foz do Iguaçu 25













PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e







19. Sala de Informática:

a. **Porta P1: 90x210:** Em desacordo com o especificado/ falta acabamento.
b. **Janela: 300x120 (fachada sul) 02 janelas:** Os puxadores das janelas apresentam peso excessivo, comprometendo a facilidade de manuseio.
c. **Acabamento – Roda meio:** Encontra-se divergente da especificada.
d. **Acabamento – Piso:** Em conformidade quanto à execução, porém apresenta sujidade.
e. **Acabamento – Pintura Teto:** Necessária a realização de uma segunda demão de pintura no local.
f. **Acabamento – Pintura Parede:** Necessária a realização de uma segunda demão de pintura no local.
g. **Acabamento – Luminária / Interruptores:** Ok, porém apresenta a ausência de uma luminária.





FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e













PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e






20. Vestiário Feminino:

a. **Janela: 130x80 / 200x80 (fachada sul):** Constata-se a ausência de puxador e de acabamentos.
b. **Revestimento parede:** Falta acabamento quinas cerâmicas.
c. **Acabamento – Piso:** Em conformidade quanto à execução, porém apresenta sujidade.
d. **Acabamento – Pintura Teto:** Verifica-se a ausência de acabamento realizado com lixa.
e. **Pia:** Torneiras em desacordo com o especificado.
f. **Divisórias:** A divisória dos banheiros apresenta espessura inferior à especificada.
g. **Portas / fechaduras:** Ausência do acabamento das fechaduras.
h. **Aspecto relevante a ser observado:** A queda do chuveiro está errada, tendo fuga de água para fora da área.







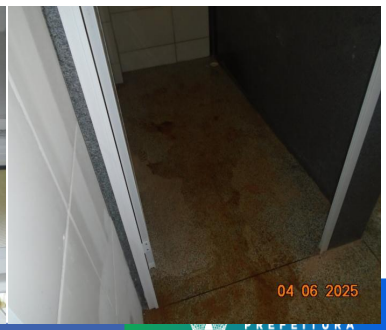

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

21. Vestiário Masculino:

a. **Janela: 130x80 / 200x80 (fachada sul):** Constata-se a ausência de puxador.
b. **Revestimento parede:** Falta acabamento nas quinas cerâmicas.
c. **Acabamento – Piso:** Em conformidade quanto à execução, porém apresenta sujidade.
d. **Acabamento – Pintura Teto:** Necessária a realização de uma segunda demão de pintura no local.
e. **Pia:** Torneiras em desacordo com o especificado.
f. **Sanitário:** Mictório a ser instalado.
g. **Divisórias:** A divisória dos banheiros apresenta espessura inferior à especificada.
h. **Aspecto relevante a ser observado:** A queda do chuveiro está errada, tendo fuga de água para fora da área.













FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

22. Almoxarifado:

a. **Janela:** Constata-se a ausência de puxador e de acabamentos.
b. **Acabamento – Piso:** Em conformidade quanto à execução, porém apresenta sujidade.
c. **Acabamento – Pintura Teto:** Necessária a realização de uma segunda demão de pintura no local.
d. **Acabamento – Pintura Parede:** Parte da parede está sem massa; e necessária a realização de uma segunda demão de pintura no local.









PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

23. Cozinha / Área de Preparo / Pré Lavagem / Depósito de Alimentos:

a. Acabamento – Pintura Teto: Buraco existente na laje; necessária a realização de uma segunda demão de pintura no local.
b. **Aspectos relevantes a serem observados:** Acabamento necessário na quina da cerâmica, ausência do guichê e lavatórios, e cerâmicas sujas de tinta.













FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e













PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e













PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e







24. Pátio Interno

a. **Acabamento – Revestimento Pastilha:** Acabamento necessário na pastilha no encontro da porta central.
b. **Acabamento – Piso:** Em conformidade quanto à execução, porém apresenta sujidade.
c. **Acabamento – Pintura Teto/forro:** Ok, porém é necessário a limpeza do forro próximo a sala 1.
d. **Acabamento – Pintura Parede:** Necessária a realização de uma segunda demão de massa no local.
e. **Acabamento – Luminária / Interruptores:** As luminárias estão nos conformes; no entanto, os espelhos dos interruptores e tomadas estão ausentes.
f. **Acabamento – Paver / Calçada / Drenagem:** Ok. Porém é necessário a pintura do paver.
g. **Aspectos relevantes a serem observados:** Tratamento nas juntas de dilatação e o quadro elétrico próximo a sala 2 está desalinhado.

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e





PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

















FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e











25. DML:

a. **Janela:** Necessário acabamento na vista e ausência do puxador.
b. **Luminária / Interruptores**: Ausência de uma luminária.
c. **Paredes:** Falta de acabamento quina cerâmica.
d. **Teto:** Necessária a realização de uma segunda demão de massa no local.
e. **Lavatórios:** Ausente.

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e



26. Corredor Lavatório/ Vestiários:

a. **Portas:** Divergentes do especificado.
b. **Revestimento Pastilha:** Detalhe da pastilha da quina próxima a porta.
c. **Paredes:** Necessária a realização de uma segunda demão de massa no local.
d. **Luminária / Interruptores**: Ausência de espelhos nos interruptores.
e. **Teto**: Necessária a realização de uma segunda demão de tinta no local.
f. **Bancada/Torneiras**: Torneiras divergentes da especificada.
g. **Esquadrias**: Porta de saída de emergência lado direito com falha para fechar.



PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e









27. Sanitário Funcionário Masculino:

a. **Janela:** Ausência de janela.
b. **Paredes:** Acabamento quina cerâmica e limpeza.
c. **Teto:** Necessária segunda demão de tinta no teto.
d. **Aspecto relevante a ser observado:** Ausência do lavatório.





PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e





28. Sanitário Funcionário Feminino:

a. **Janela:** Ausência de janela.
b. **Paredes:** Acabamento quina cerâmica e limpeza, além de ausência de rejunte cerâmica em cima das portas.
c. **Teto:** Necessária segunda demão de tinta no teto.
d. **Aspecto relevante a ser observado:** Ausência do lavatório.









PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Prefeitura de Foz do Iguaçu 48
Prefeitura de Foz do Iguaçu 47
Prefeitura de Foz do Iguaçu 41





29. Corredor para o Sanitário Funcionários:

a. **Pastilha:** Ok, porém falta calefatagem em um ponto.
b. **Paredes:** Acabamento quina cerâmica e limpeza, além do local encontra-se apenas emassado, sem acabamento final.
c. **Teto:** Necessário acabamento no buraco da laje e segunda demão de tinta no teto.
d. **Aspecto relevante a ser observado:** Ausência do lavatório.









PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

30. Pátio Externo:

a. **Muro Palito**: Próximo à rampa de acesso a estrutura do muro está exposta.
b. **Rampa de acesso:** Pilar construído para a rampa de acesso consta com armadura não respeitando os espaçamentos.
c. **Calçada externa / Escada / Rampa:** Falta adequações, inclinação da rampa construída inicialmente não atende a inclinação solicitada em projeto.
d. **Acabamento – Pintura Parede:** Fachada norte e fachada oeste falta pintura.
e. **Acabamento – Paver / Calçada / Drenagem:** Paver inacabado rua Gaspar, e rua Macaé paver consta com camada de vegetação.Caixas de passagem faltam acabamentos.
f. **Caixa d'água:** Buraco fundações expostos a intempéries, rever antes da concretagem.
g. **Elétrica:** Eletroduto em bitola inferior a requisitada em projeto.









PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e













- **A contratada fica devidamente advertida quanto à necessidade de corrigir as inconformidades listadas, bem como as apontadas em obra, com a devida urgência, sob pena de aplicação das sanções previstas em contrato.**

Foz do Iguaçu, 06 de junho de 2025

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 06/06/2025 às 14:11:33, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:12:20 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 06/06/2025 às 14:15:58
Documento Código: 91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **NOTIFICAÇÃO DE OBRAS**

Número: **39/2025**

Assunto: **NOTIFICAÇÃO DE INCONFORMIDADES OBRA ESCOLA CANDIDO PORTINARI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
91698430-b93c-4a9a-b878-c13731bf8d75

Hash do Documento

43591A841236261AAE6C6A960792EA56AC93D526A9D8955C5E8A5D0C5AB36996

Anexos

AUDITORIA OBRA CANDIDO.pdf - **cadea620-0b91-465b-b0df-d34e21e678f0**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/03/2026 é(são) :

THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR (Signatário) - CPF: ***80918959** em 06/06/2025 14:15:58 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

EVERSON LAUFER (Signatário) - CPF: ***62125993** em 06/06/2025 14:12:20 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

LEONARDO TOFFOLI FALK (Signatário) - CPF: ***77561902** em 06/06/2025 14:11:33 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Prefeitura de Foz do Iguaçu 53
Prefeitura de Foz do Iguaçu 52
Prefeitura de Foz do Iguaçu 1

NOTIFICAÇÃO


DADOS DO CONTRATO

OBRA: Construção da Escola Municipal Cândido Portinari			**CONTRATO**: 235/2023
Ass. do CT: 09/11/2023	**O.S:** 14/11/2023	**Execução**: 06/05/2025	**Vigência**: 31/07/2025
CONTRATADA: ANCEMA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 06.974.313/0001-27			

A Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu (CONTRATANTE) por intermédio da Secretaria Municipal de Obras – SMOB **NOTIFICA** a CONTRATADA Ancema Construções LTDA pelo descumprimento contratual conforme relatório de inconformidades.

Durante vistorias realizadas na obra foram identificadas a seguinte inconformidade:

1. Os eletrodutos instalados localizados após a primeira caixa de passagem saindo do padrão de energia, foram instalados em bitolas inferiores às solicitadas em projeto, e inferiores ao exigido pela norma técninca.
   Após notificada, a empresa apresentou a solução dizendo que como seria somente um circuito que passaria por esses eletrodutos, essa bitola instalada atenderia. Dito isso, foi constatado que pela nomenclatura, refere-se a dois circuitos, passando um por cada eletroduto.
   Solicita-se que a empresa adeque os eletrodutos, para que atendam os dois circuitos que deverão passar por eles, de modo a preservar a segurança e durabilidade da instalação.

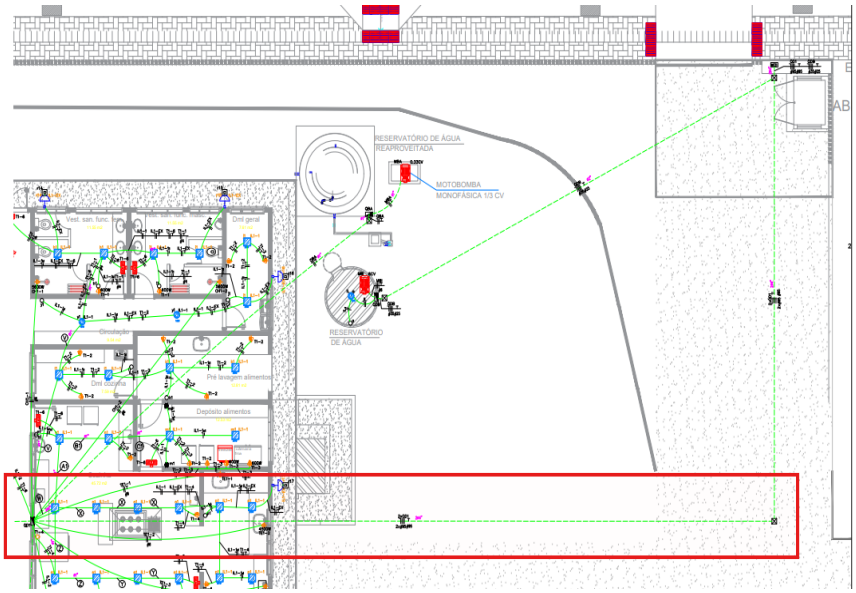



Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 09/07/2025 às 13:14:50, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 09/07/2025 às 13:24:57, THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 09/07/2025 às 15:59:39 e SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 09/07/2025 às 17:43:01
Documento Código: 5a5b879c-bea1-403c-a1c3-84755bbb2e2f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5a5b879c-bea1-403c-a1c3-84755bbb2e2f

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

5a5b879c-bea1-403c-a1c3-84755bbb2e2f
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

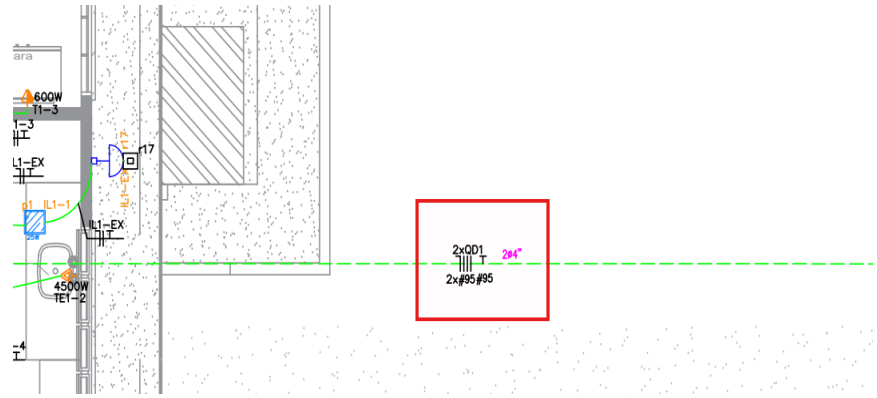

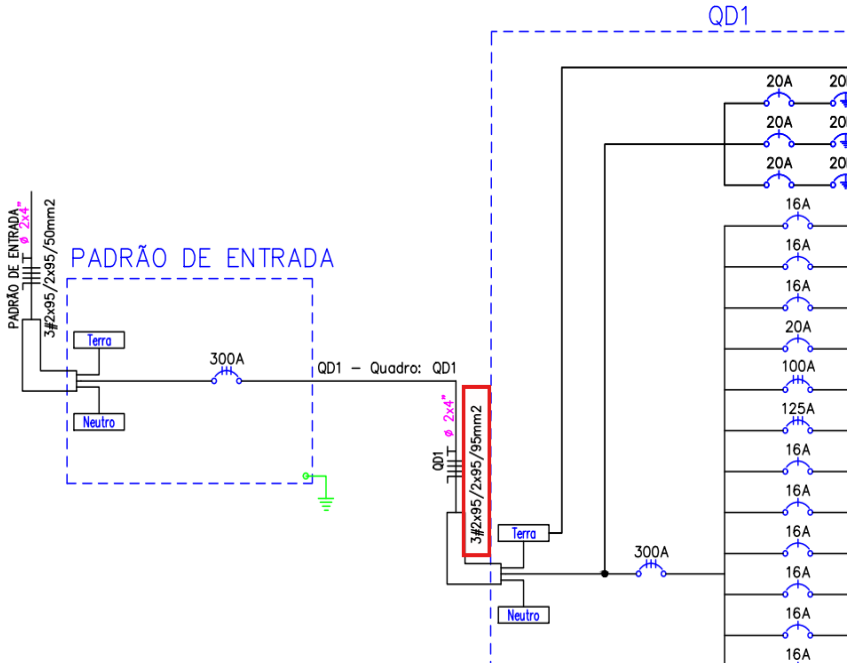

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 09/07/2025 às 13:14:50, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 09/07/2025 às 13:24:57, THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 09/07/2025 às 15:59:39 e SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 09/07/2025 às 17:43:01
Documento Código: 5a5b879c-bea1-403c-a1c3-84755bbb2e2f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5a5b879c-bea1-403c-a1c3-84755bbb2e2f

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

5a5b879c-bea1-403c-a1c3-84755bbb2e2f
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Prefeitura de Foz do Iguaçu 55
Prefeitura de Foz do Iguaçu 54
Prefeitura de Foz do Iguaçu 3

Considerações finais

Para menor intervenção na estrutura, poderá ser aceito que a empresa execute essa tubulação enterrada somente até a edificação da escola, e que siga de maneira externa, por cima da edificação, até a chegada ao quadro de distribuição 01.
Fica a CONTRATADA advertida apresentar a solução para a fiscalização e iniciar os reparos de imediato.

Foz do Iguaçu, 09 de julho de 2025

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 09/07/2025 às 13:14:50, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 09/07/2025 às 13:24:57, THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 09/07/2025 às 15:59:39 e SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 09/07/2025 às 17:43:01
Documento Código: 5a5b879c-bea1-403c-a1c3-84755bbb2e2f - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=5a5b879c-bea1-403c-a1c3-84755bbb2e2f

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

5a5b879c-bea1-403c-a1c3-84755bbb2e2f
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **NOTIFICAÇÃO DE OBRAS**

Número: **52/2025**

Assunto: **NOTIFICAÇÃO DE INCONFORMIDADES OBRA ESCOLA CANDIDO PORTINARI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=5a5b879c-bea1-403c-a1c3-84755bbb2e2f
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
5a5b879c-bea1-403c-a1c3-84755bbb2e2f

Hash do Documento

B48EB75676A17F7B5AA39BB788DBF538A87E3C2873D29FEF97B8902E46D4E9D0

Anexos

NOTIFICAÇÃO ELÉTRICA.pdf - **93ed0ba9-52c0-4792-b567-fa0d97c7020c**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/03/2026 é(são) :

THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR (Signatário) - CPF: ***80918959** em 09/07/2025 15:59:39 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

LEONARDO TOFFOLI FALK (Signatário) - CPF: ***77561902** em 09/07/2025 13:14:50 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

EVERSON LAUFER (Signatário) - CPF: ***62125993** em 09/07/2025 13:24:57 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

SILVANA GARCIA ANDRE (Signatário) - CPF: ***25894987** em 09/07/2025 17:43:01 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

NOTIFICAÇÃO			
DADOS DO CONTRATO			
OBRA: Construção da Escola Municipal Cândido Portinari		**CONTRATO**: 235/2023	
Ass. do CT: 09/11/2023	**O.S:** 14/11/2023	**Execução**: 06/05/2025	**Vigência**: 31/07/2025
CONTRATADA: ANCEMA CONSTRUÇÕES LTD – CNPJ: 06.974.313/0001-27			

O presente documento tem como finalidade apresentar a síntese das inconformidades identificadas durante a execução do contrato 0235/2023 que possui como objeto a construção da Escola Municipal Cândido Portinari.

1. **Prazos:**
   a. Prazo do Execução: 06 de Maio de 2025.
   b. Percentual Medido / Executado: até 24 de Julho de 2025: 76,01%
   c. Atraso: Considerando o Cronograma de execução, aos 390 dias a obra deveria estar com 78,60% dos serviços concluídos, ou seja, a meta atual deveria ser atingida em 08 de Dezembro de 2024.
   d. Dias de Atraso: em 24/07/2025 a obra está com 228 dias de atraso.

> *CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA*
> *p) Entregar a obra/serviço, após a emissão da ordem de serviço, totalmente finalizada no prazo especificado no edital, com todos os serviços necessários, e de que a obra/serviço será executada com extrema qualidade e dentro do melhor padrão de qualidade possível;*
>
> *CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA APLICAÇÃO DAS MULTAS*
> *a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia consecutivo que exceder à data prevista para conclusão do(s) serviço(s);*

2. **Evolução de Execução do Contrato**:
   a. A CONTRATADA não mantém em canteiro de obras a quantidade de colaboradores compatível com os serviços a serem executados;
   b. A CONTRATADA não mantém materiais suficiente para a execução dos serviços pendentes.
   c. Em diligências foi identificado que os colaboradores não fazem o devido uso dos Equipamentos de Proteção Individuais – EPI´s
   d. Diário de Obras: O Diário de Obras Digital está a pelo menos 30 dias sem atualização.

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU Secretaria de Obras Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 24/07/2025 às 16:31:27, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 24/07/2025 às 16:35:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 24/07/2025 às 17:41:11 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 25/07/2025 às 09:59:16
Documento Código: 3474bc1d-5cc2-4a6d-9787-bb331af02efe - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=3474bc1d-5cc2-4a6d-9787-bb331af02efe

3474bc1d-5cc2-4a6d-9787-bb331af02efe

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Parágrafo Segundo - A CONTRATADA deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual e deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPI's.

CLÁUSULA NONA - DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
Deverá ser dada ênfase na exigência do diário de obras, atualizado e preenchido com todas as informações relevantes para futuras análises do desempenho da CONTRATADA [...]

3. Da Execução dos Serviços:

Identifica-se a execução de diversos serviços em inconformidade com projeto e/ou com as especificações técnicas listadas no Memorial Técnico Descritivo. Também existem serviços executados que apresentaram patologias posteriores que até a presente data não foram sanadas:

a. Cobertura:
   i. Não se identifica a execução do sistema de contraventamento;
   ii. Calhas: Condutores de descidas das águas pluviais estão inoperantes, com instalações em desconformidades com especificações técnicas;
   iii. Telhas: Devido erro na execução da cobertura em período pretérito houve a remoção de todas as telhas e a posterior reinstalação, fato que culminou na execução da cobertura com telhas em excesso de sujidade, amassados, e pontos com perfurações.

b. Esquadrias de Alumínio:
   Diversas janelas tipo venezianas executadas apresentam funcionamento irregular, sendo que não existe o sistema de travamento. Considerando a segurança do espaço é de extrema importância a correta execução do item supracitado.
   i. Portas de Alumínio: As portas executadas não seguem as especificações técnicas listadas no memorial técnico descritivo, sendo executada com material inferior e em desconformidade com as normas técnicas;

c. Sanitários e Lavatórios:
   i. As divisórias em granito dos sanitários foram executadas com espessura inferior ao especificado em planilha. Podendo comprometer a segurança dos usuários;
   ii. As bancadas dos lavatórios foram instaladas com utilização de torneiras com qualidade inferior ao especificado no Memorial Técnico Descritivo;

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 24/07/2025 às 16:31:27, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 24/07/2025 às 16:35:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 24/07/2025 às 17:41:11 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 25/07/2025 às 09:59:16
Documento Código: 3474bc1d-5cc2-4a6d-9787-bb331af02efe - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=3474bc1d-5cc2-4a6d-9787-bb331af02efe

3474bc1d-5cc2-4a6d-9787-bb331af02efe

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Prefeitura de Foz do Iguaçu 60
Prefeitura de Foz do Iguaçu 59
Prefeitura de Foz do Iguaçu 3

d. Acesso Principal:

i. Por erro de execução a escola ficou com nível aproximadamente 30cm acima do previsto em projeto. Fato de acarretou no acréscimo de degraus que invadem a área destinada ao passeio público.

ii. Escada: Conforme previsto em projeto a escada deve ser executada em concreto armado, porém a contratada executou utilizando tijolos cerâmicos.

iii. Corrimão e Guarda Corpo: Conforme especificado o material a ser utilizado é aço galvanizado com parede de espessura 3,00mm porém foi aplicado em obra, estrutura em aço simples e parede de 1,3mm. Qualidade inferior ao especificado.

e. Piso em Concreto Pátio Externo / Estacionamento:

Serviço executado com baixa qualidade de acabamento. Corte das juntas de dilatação em desconformidade com as especificações técnicas.

f. Execução piso intertravado:

A execução do piso (paver) na área externa da edificação apresenta deformidades, e a utilização de peças quebradas / manchadas com tintas, não atendendo o padrão mínimo de qualidade aceitável.

g. Alvenaria / Estrutura:

Identifica-se diversos pontos de trincas, fissuras, rachaduras em toda a edificação, que não foram devidamente tratadas, o mesmo ocorre com piso em concreto da quadra coberta.

Existem pontos os quais a pintura esta desplacando, além de tonalidades de pinturas diferentes no mesmo plano;

Existem pontos de dilatações que não foram devidamente executados;

h. Castelo d´água:

Conforme especificado em memorial, a previsão de aquisição do castelo d´água direto da indústria. Na obra em questão o produto foi fabricado pela CONTRATADA, desta forma se faz necessário a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de projeto e execução do mesmo e termo de garantia.

3474bc1d-5cc2-4a6d-9787-bb331af02efe
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 24/07/2025 às 16:31:27, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 24/07/2025 às 16:35:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 24/07/2025 às 17:41:11 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 25/07/2025 às 09:59:16
Documento Código: 3474bc1d-5cc2-4a6d-9787-bb331af02efe - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=3474bc1d-5cc2-4a6d-9787-bb331af02efe

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Assegurar a execução do objeto deste contrato conforme especificado no ANEXO II- Projeto Básico do Edital de Licitação supracitado, dentro dos melhores padrões de qualidade possível, além da proteção e a conservação dos serviços executados;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO DO OBJETO

Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

I. Advertência;

II. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório;

III. Impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA APLICAÇÃO DAS MULTAS

b) Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais;

c) Pela inexecução parcial do Contrato, a Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que no caso de multa, esta corresponderá a 10% do valor da parcela inadimplida;[...]

Quando da aplicação de multas, o Contratante notificará a CONTRATADA que terá prazo de 10 (dez) dias para recolher à Tesouraria do Contratante a importância correspondente, sob pena de incorrer em outras sanções cabíveis.

Parágrafo Primeiro - As sanções previstas nesta cláusula poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.

Parágrafo Segundo - A multa será cobrada pelo Contratante de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente. Caso a CONTRATADA não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou será descontada do valor da garantia de execução.

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 24/07/2025 às 16:31:27, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 24/07/2025 às 16:35:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 24/07/2025 às 17:41:11 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 25/07/2025 às 09:59:16
Documento Código: 3474bc1d-5cc2-4a6d-9787-bb331af02efe - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=3474bc1d-5cc2-4a6d-9787-bb331af02efe

3474bc1d-5cc2-4a6d-9787-bb331af02efe

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

4. Considerações Finais

Estabelece-se o prazo de 72 horas a partir da ciência para que a empresa apresente defesa em relação à presente notificação.

3474bc1d-5cc2-4a6d-9787-bb331af02efe

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 24/07/2025 às 16:31:27, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 24/07/2025 às 16:35:17, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 24/07/2025 às 17:41:11 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 25/07/2025 às 09:59:16
Documento Código: 3474bc1d-5cc2-4a6d-9787-bb331af02efe - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=3474bc1d-5cc2-4a6d-9787-bb331af02efe

0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **NOTIFICAÇÃO DE OBRAS**

Número: **63/2025**

Assunto: **NOTIFICAÇÃO OBRA EMEF CÂNDIDO PORTINARI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=3474bc1d-5cc2-4a6d-9787-bb331af02efe
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
3474bc1d-5cc2-4a6d-9787-bb331af02efe

Hash do Documento

E9B0968EC2FAE317B8C4E7FF57334B421E2AE31344EA9ADBD93BB93EAE9079FB

Anexos

NOTIFICAÇÃO ESCOLA CANDIDO.pdf - **b4d092c1-9313-4304-ae7d-f6f8351e7e50**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/03/2026 é(são) :

THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR (Signatário) - CPF: ***80918959** em 25/07/2025 9:59:16 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

EVERSON LAUFER (Signatário) - CPF: ***62125993** em 24/07/2025 16:35:17 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

LEONARDO TOFFOLI FALK (Signatário) - CPF: ***77561902** em 24/07/2025 16:31:27 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

SILVANA GARCIA ANDRE (Signatário) - CPF: ***25894987** em 24/07/2025 17:41:11 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

NOTIFICAÇÃO			
DADOS DO CONTRATO			
OBRA: Construção da Escola Municipal Cândido Portinari		**CONTRATO**: 235/2023	
Ass. do CT: 09/11/2023	**O.S:** 14/11/2023	**Execução**: 06/05/2025	**Vigência**: 31/07/2025
CONTRATADA: ANCEMA CONSTRUÇÕES LTD – CNPJ: 06.974.313/0001-27			

1. **Prazos:**
   a. Prazo do Execução: 06 de Maio de 2025.
   b. Percentual Medido / Executado: 78,60%
   c. Atraso: Considerando o Cronograma de execução, aos 390 dias a obra deveria estar com 78,60% dos serviços concluídos, ou seja, a meta atual deveria ser atingida em 08 de Dezembro de 2024.
   d. Dias de Atraso: em 03/09/2025 a obra está com 244 dias de atraso.

Em decorrência da fiscalização realizada na data de 02/09/2025, foi constatado que a CONTRATADA não mantém em canteiro de obras a quantidade de trabalhadores compatível com os serviços a serem executados, uma vez que apenas 01 (um) trabalhador estava presente no local, realizando atividades de recolhimento de materiais, sem execução efetiva das atividades previstas, além de não dispor de materiais suficientes para a execução dos serviços pendentes.

Considerando o acompanhamento da obra e o histórico de descumprimento de prazos, é importante registrar que, nos últimos dias, não se observou qualquer avanço significativo nas atividades da obra. A empresa contratada mantém, atualmente, um número reduzido de trabalhadores no canteiro de obras, o que tem comprometido ainda mais o andamento da execução.

Diante do exposto, a fiscalização solicita, com urgência, o esclarecimento sobre as ações que serão adotadas pela empresa para superar os atrasos, garantir a qualidade dos serviços executados e concluir a obra dentro dos parâmetros acordados.

Solicita-se também que, no prazo de 05 dias, seja apresentado um plano de ação detalhado que contemple:

Ajustes no cronograma de execução, com novas datas e etapas realistas para a conclusão da obra;

Plano de melhorias na execução dos serviços, com descrição de medidas corretivas que garantam a conformidade com as especificações e os padrões de qualidade exigidos;

Relatório de progresso, a ser enviado semanalmente, com atualização detalhada sobre o andamento da obra e a evolução dos trabalhos.

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 03/09/2025 às 08:38:59, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 03/09/2025 às 09:01:28, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 03/09/2025 às 09:03:52 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 03/09/2025 às 09:27:57
Documento Código: a78eb1e0-b777-4beb-930b-1694d87310cd - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=a78eb1e0-b777-4beb-930b-1694d87310cd

a78eb1e0-b777-4beb-930b-1694d87310cd

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Em caso de não atendimento às demandas solicitadas ou continuidade das falhas na execução da obra, a contratante tomará as providências necessárias, conforme estabelecido no contrato, para resguardar seus direitos.

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 03/09/2025 às 08:38:59, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 03/09/2025 às 09:01:28, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 03/09/2025 às 09:03:52 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 03/09/2025 às 09:27:57
Documento Código: a78eb1e0-b777-4beb-930b-1694d87310cd - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=a78eb1e0-b777-4beb-930b-1694d87310cd

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

a78eb1e0-b777-4beb-930b-1694d87310cd
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **NOTIFICAÇÃO DE OBRAS**

Número: **75/2025**

Assunto: **NOTIFICAÇÃO DE INCONFORMIDADES OBRA ESCOLA CÂNDIDO PORTINARI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=a78eb1e0-b777-4beb-930b-1694d87310cd
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
a78eb1e0-b777-4beb-930b-1694d87310cd

Hash do Documento

70EE7A4B0A420DF67D2F4D44E27A00D96905305A7616D90D4F46BE931DCB2488

Anexos

NOTIFICAÇÃO ESCOLA CANDIDO 03-09-2025.pdf - **b9d0dd32-8436-4819-bf63-7af13d0717f6**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/03/2026 é(são) :

THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR (Signatário) - CPF: ***80918959** em 03/09/2025 9:27:57 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

SILVANA GARCIA ANDRE (Signatário) - CPF: ***25894987** em 03/09/2025 9:03:52 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

LEONARDO TOFFOLI FALK (Signatário) - CPF: ***77561902** em 03/09/2025 8:38:59 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

EVERSON LAUFER (Signatário) - CPF: ***62125993** em 03/09/2025 9:01:28 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMOB
DIRETORIA DE OBRAS – DIOB

NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO CONTRATUAL
Contrato Administrativo nº 235/2023 – Concorrência Pública nº 009/2023
Objeto: Construção da Escola Municipal Cândido Portinari

NOTIFICADA:
ANCEMA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 06.974.313/0001-27
Rua Irani Garcia nº 210 – Distrito Industrial – Foz do Iguaçu/PR

I – DOS FATOS

O Município de Foz do Iguaçu, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, na qualidade de **Contratante**, vem, por meio da presente, **NOTIFICAR** a empresa ANCEMA CONSTRUÇÕES LTDA, ora **Contratada**, em razão do descumprimento das obrigações assumidas no Contrato Administrativo nº 235/2023.

Consoante relatório do Fiscal do Contrato, em vistoria realizada em **22 de setembro de 2025**, foi constatada **ausência total de movimentação no canteiro de obras** destinado à execução da Escola Municipal Cândido Portinari, inexistindo trabalhadores, equipamentos e materiais no local. Ressalte-se que a Contratada já foi advertida em ocasiões anteriores acerca de atrasos na execução contratual, permanecendo em situação de **mora perante a Administração**.

II – DOS FUNDAMENTOS CONTRATUAIS

Nos termos das disposições contratuais, compete à Contratada:

- Assegurar a execução do objeto conforme padrões de qualidade e dentro dos prazos avençados (Cláusula Oitava, alínea “a”);
- Disponibilizar, às suas expensas, todos os equipamentos, materiais, serviços e pessoal necessários à execução do objeto contratual (Cláusula Oitava, alínea “m”);
- Manter em obra quantitativo adequado de funcionários, devidamente registrados, compatível com o cronograma e anotado em diário de obras (Cláusula Oitava, alínea “n”);
- Notificar a fiscalização, de forma prévia e formal, sobre qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a execução (Cláusula Oitava, alínea “i”);
- Cumprir rigorosamente o **Cronograma Físico-Financeiro**, parte integrante do contrato (Cláusula Quinta).

O inadimplemento das referidas cláusulas enseja a aplicação das penalidades previstas na **Cláusula Décima Primeira e Décima Segunda**, a saber:

- **Advertência**;
- **Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia de atraso**, o que corresponde a R$ 4.788,36 (quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos) por dia;

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 23/09/2025 às 08:48:42, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 23/09/2025 às 10:22:17 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 23/09/2025 às 10:53:32
Documento Código: a730f76a-87c3-4911-bb90-790127fd47bc - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=a730f76a-87c3-4911-bb90-790127fd47bc

a730f76a-87c3-4911-bb90-790127fd47bc

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

- **Multa de 1% (um por cento) do valor contratual** em caso de descumprimento de obrigações específicas;
- **Multa de até 10% (dez por cento)** do valor contratual em caso de inexecução parcial ou total.

III – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

A conduta da Contratada afronta diretamente os dispositivos da **Lei nº 8.666/93**, notadamente:

- **Art. 66** – que impõe a execução fiel do contrato, em conformidade com suas cláusulas e normas técnicas;
- **Art. 67** – que estabelece o dever de acompanhamento e fiscalização da execução;
- **Art. 70** – que atribui à contratada a responsabilidade pela fiel execução contratual;
- **Art. 78, incisos I, II e IV** – que caracterizam como causa de rescisão o não cumprimento das cláusulas contratuais, a paralisação da obra sem justa causa e o descumprimento dos prazos estabelecidos;
- **Art. 87** – que prevê a aplicação das sanções administrativas de advertência, multa, suspensão de contratar e declaração de inidoneidade.

IV – DA NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO

Diante do exposto, a **ANCEMA CONSTRUÇÕES LTDA** fica **NOTIFICADA E INTIMADA** a:

1. Restabelecer, de imediato, as atividades no canteiro de obras, mobilizando mão de obra, materiais e equipamentos compatíveis com o cronograma físico-financeiro;
2. Apresentar, no prazo improrrogável de **05 (cinco) dias úteis**, **plano de recuperação da execução contratual**, com cronograma atualizado, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis;
3. Ciente de que a persistência do inadimplemento poderá ensejar:
    - Aplicação das multas contratuais;
    - Rescisão unilateral do contrato, nos termos do art. 78, da Lei nº 8.666/93;
    - Demais sanções previstas em lei e no contrato, sem prejuízo de eventual responsabilização por perdas e danos causados ao Município.

V – DO PRAZO E CIÊNCIA

A presente notificação é expedida para fins de ciência inequívoca da Contratada, produzindo efeitos legais a partir de seu recebimento, servindo como documento hábil para instruir eventual processo administrativo sancionatório e/ou de rescisão contratual.

PREFEITURA FOZ DO IGUAÇU
Secretaria de Obras
Cidade que inspira e trabalha

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 23/09/2025 às 08:48:42, EVERSON LAUFER - DIRETOR DE OBRAS - 23/09/2025 às 10:22:17 e THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS - 23/09/2025 às 10:53:32
Documento Código: a730f76a-87c3-4911-bb90-790127fd47bc - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=a730f76a-87c3-4911-bb90-790127fd47bc

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

a730f76a-87c3-4911-bb90-790127fd47bc
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **NOTIFICAÇÃO DE OBRAS**

Número: **81/2025**

Assunto: **NOTIFICAÇÃO OBRA EMEF CÂNDIDO PORTINARI**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=a730f76a-87c3-4911-bb90-790127fd47bc
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
a730f76a-87c3-4911-bb90-790127fd47bc

Hash do Documento

401F984E86594D4EB3BE83D2C4BEA491163E008A61A5A77A4BC947F0B261A2A7

Anexos

NOTIFICAÇÃO ANCEMA AUSÊNCIA DE ATIVIDADE.pdf - **e13f3944-5231-4daa-807c-678d8fa377b9**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/03/2026 é(são) :

LEONARDO TOFFOLI FALK (Signatário) - CPF: ***77561902** em 23/09/2025 8:48:42 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

EVERSON LAUFER (Signatário) - CPF: ***62125993** em 23/09/2025 10:22:17 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

THAIS RAMOS RIBEIRO ESCOBAR (Signatário) - CPF: ***80918959** em 23/09/2025 10:53:32 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Autenticado com senha por LEONARDO TOFFOLI FALK - ENGENHEIRO CIVIL - 19/03/2026 às 10:06:45, IVATAN BATISTA DOS REIS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - 19/03/2026 às 14:30:50 e VALDIR LAVINICKI - DIRETOR DE OBRAS - 20/03/2026 às 13:42:30
Documento Código: 0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **18.904/2026**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 181/2026**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
0a550454-0b9b-4adc-886c-cdd1eca16a86

Hash do Documento

3170C6D434FC7DD418716241E7FF23A1DA06D466224E2AC149F3DF28CA9C6F17

Anexos

NOTIFICAÇÃO DE OBRAS- Nº 39-2025 (2).pdf - **784e8010-3bf4-488c-b335-82f8bf1d2fb5**
NOTIFICAÇÃO DE OBRAS- Nº 52-2025 (1).pdf - **38d4da06-992b-46c5-a5d2-3c5d4087e1bd**
NOTIFICAÇÃO DE OBRAS- Nº 63-2025 (1).pdf - **7cd44906-a980-486b-87dd-30c74e3b428f**
NOTIFICAÇÃO DE OBRAS- Nº 75-2025 (2).pdf - **c5c14662-242d-48dd-a644-a8ff315b9620**
NOTIFICAÇÃO DE OBRAS- Nº 81-2025 (2).pdf - **4f70f931-e75f-41b0-a283-f3c5f7c0ab91**
RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES VEREADORA VALENTINA.pdf - **7c887738-5db4-4c34-8fdb-c4871290e410**
05 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 41_ASS.pdf - **0987547a-91b2-481d-ae03-db4d357b8c4f**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/03/2026 é(são) :

LEONARDO TOFFOLI FALK (Signatário) - CPF: ***77561902** em 19/03/2026 10:06:45 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

VALDIR LAVINICKI (Signatário) - CPF: ***09358934** em 20/03/2026 13:42:30 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

IVATAN BATISTA DOS REIS (Signatário) - CPF: ***70675960** em 19/03/2026 14:30:50 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMED - DIRETORIA GERAL	**Data:** 24/03/2026
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	**Número:** 20412/2026
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 181/2026	

Em atenção ao Requerimento n°181/2026, segue:

14- A unidade está apta a iniciar o ano letivo no ano de 2026 conforme divulgado? Quais documentos técnicos comprovam essa aptidão?

No presente momento, a unidade ainda não se encontra apta para funcionamento sob responsabilidade desta Secretaria, uma vez que a obra não foi formalmente entregue.

15- Há previsão de datas para início da mudança das turmas e professores para a nova estrutura?

Conforme informado pela SMOB (item 4), a previsão de entrega da obra é para o final de abril de 2026. Após a entrega, será necessária a realização de processo gradual de realocação de mobiliários, bem como da equipe pedagógica, administrativa e operacional para a nova unidade. Estima-se que essa etapa demande aproximadamente 30 dias, para então viabilizar a transição da comunidade escolar.

16- De que forma o atraso na entrega da obra está sendo comunicado à comunidade escolar e quais medidas estão sendo tomadas para minimizar prejuízos pedagógicos?

Do ponto de vista pedagógico, não houve prejuízos, tendo em vista que as atividades escolares foram mantidas na unidade atual, conforme o planejamento estabelecido

17- A informação publicada no site oficial da Prefeitura de que "a partir do mês de fevereiro, a comunidade escolar iniciará a transição para o novo prédio de forma organizada e planejada" foi baseada em qual relatório técnico ou cronograma oficial da obra?

A informação publicada teve como base o cronograma de entrega da obra encaminhado pela SMOB, conforme mencionado no item 3 (06/05/2025).

Ressalta-se que a previsão inicial indicava a conclusão da obra em data anterior, o que permitiria o início da transição da comunidade escolar em prazo mais próximo à entrega.

Autenticado com senha por VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL - 13/04/2026 às 16:38:22, SANDRO FERREIRA MONMA - COORDENADOR DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO - 13/04/2026 às 16:39:05, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 13/04/2026 às 17:31:26, TATIANE FERREIRA BRILL - DIRETORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESCOLAR - 13/04/2026 às 21:24:36 e DOUGLAS DA CONCEICAO SANTOS - FISCAL DE CONTRATO - 14/04/2026 às 07:40:14
Documento Código: e74b66b4-2a99-4795-95dc-70f9d76206a7 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e74b66b4-2a99-4795-95dc-70f9d76206a7

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

e74b66b4-2a99-4795-95dc-70f9d76206a7

e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Entretanto, em razão de atraso na conclusão da obra, não ocorrida na data prevista (06/05/2025), houve a necessidade de readequação do planejamento, sendo então programado o início da transição para fevereiro de 2026.

18- A afirmação de que "a mudança será realizada ao longo do mês, priorizando o bem estar dos alunos e a continuidade das atividades pedagógicas" corresponde a qual planejamento formal aprovado pela Secretaria? Encaminhar cópia do plano de transição mencionado.

O planejamento prevê, inicialmente, a realização de vistoria técnica do prédio para fins de recebimento oficial, estimada em aproximadamente 3 (três) dias.

Na sequência, a Secretaria necessita de cerca de 30 (trinta) dias para a realocação dos mobiliários da atual sede que se encontram em bom estado, considerando a necessidade de desmontagem, transporte, remontagem e organização dos espaços, de forma a não impactar o andamento das atividades escolares.

Paralelamente, o planejamento da SMED já contempla a definição e solicitação prévia dos novos mobiliários indispensáveis, como mesas de refeitório para as crianças, mesas de trabalho para os professores, mesa oval, entre outros itens necessários, de modo que estejam disponíveis no momento da entrega da obra.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Secretaria Municipal da Educação.

Autenticado com senha por VALDIR TEIXEIRA JUNIOR - DIRETOR GERAL - 13/04/2026 às 16:38:22, SANDRO FERREIRA MONMA - COORDENADOR DE ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO - 13/04/2026 às 16:39:05, SILVANA GARCIA ANDRE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - 13/04/2026 às 17:31:26, TATIANE FERREIRA BRILL - DIRETORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESCOLAR - 13/04/2026 às 21:24:36 e DOUGLAS DA CONCEICAO SANTOS - FISCAL DE CONTRATO - 14/04/2026 às 07:40:14
Documento Código: e74b66b4-2a99-4795-95dc-70f9d76206a7 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e74b66b4-2a99-4795-95dc-70f9d76206a7

e74b66b4-2a99-4795-95dc-70f9d76206a7

e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **20.412/2026**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 181/2026**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=e74b66b4-2a99-4795-95dc-70f9d76206a7

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
e74b66b4-2a99-4795-95dc-70f9d76206a7

Hash do Documento

9F932DED689C376C3A4257B200EFBB816C99BA888D5DC0AEE4E61A5DE388A604

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/04/2026 é(são) :

SILVANA GARCIA ANDRE (Signatário) - CPF: ***25894987** em 13/04/2026 17:31:26 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

VALDIR TEIXEIRA JUNIOR (Signatário) - CPF: ***16377933** em 13/04/2026 16:38:22 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

TATIANE FERREIRA BRILL (Signatário) - CPF: ***56297997** em 13/04/2026 21:24:36 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

DOUGLAS DA CONCEICAO SANTOS (Signatário) - CPF: ***06082786** em 14/04/2026 7:40:14 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

SANDRO FERREIRA MONMA (Signatário) - CPF: ***75054957** em 13/04/2026 16:39:05 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 23/04/2026 às 09:26:26
Documento Código: e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **4.470/2026**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 181/2026**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
e265d336-383f-4201-b2b7-7a331dd3ee1e

Hash do Documento

0721244A5C5BC4CEE3546E106836967C45EBA09A5836ED03E148165217B69E19

Anexos

REQ 181-2026.pdf - **3ff90016-04ca-4bf3-9427-5c303b48b976**
RESPOSTA REQ 181-2026 - MEMORANDO INTERNO- Nº 18904-2026 - SMOB.pdf - **688529ed-29b2-4f9f-b220-8fc7cb01c010**
RESPOSTA REQ 181-2026 - MEMORANDO INTERNO- Nº 20412-2026 - SMED II.pdf - **6fd82cc9-af51-4e92-b2bb-98162a36162f**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/04/2026 é(são) :

JOAQUIM SILVA E LUNA (Signatário) - CPF: ***86476734** em 23/04/2026 9:26:26 - OK
Tipo: Assinatura Digital

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.
